


9月の現場作業

1. 9月の作業内容

9月はボーリング調査による東側石垣背面の調査や盛岡城跡整備委員会を開催しました。ボーリング調査による東側石垣背面の調査では、当初総栗石を想定していましたが、盛土が検出され、(図1)のような構造となっていることがわかりました。盛岡城跡整備委員会では、この背面調査の結果をもとに、正式に解体範囲について承認され、今年度は当初の予定どおり8段(207個)の石垣修復を行うことになりました。

また、盛岡城跡整備委員会の承認後、10月の1段目の解体に向け、石垣の裏の栗石を手作業で撤去する作業を行いました。

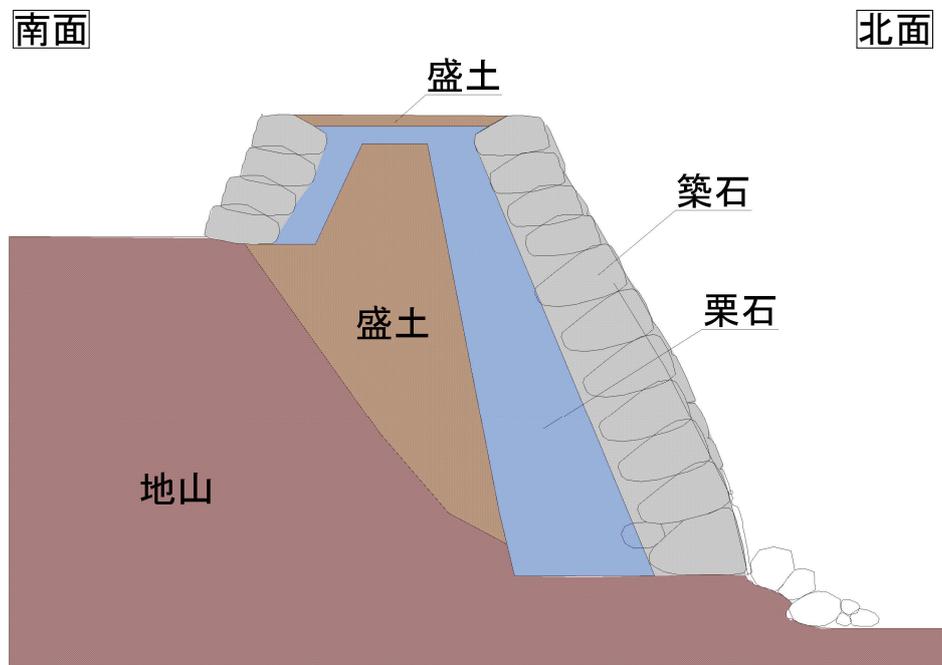

(図1) ボーリング調査の結果による想定断面図



背面栗石撤去の様子

2. 10月の予定

10月からはいよいよ大型クレーンで築石を持ち上げる作業を行います。10月は1段目～4段目（102個）の解体を行う予定です。
