


整備候補地選定スケジュール（変更後）

2017.1.26 現在

年 月	検討テーマ	検討項目	詳細内容等	
平成 27 年度	9月25日 (金)	第1回検討委員会 ・広域化基本構想説明	●委員長・副委員長選任 ●候補地検討作業計画	
	11月27日 (金)	第2回検討委員会 ・調査対象地の検討	●調査対象地抽出条件の設定 ●立地回避条件の設定<1>	①整備可能面積 ②地形・地質条件 ③法的制約条件への適合 ④災害・環境に対する安全性 ⑤既往の土地利用との整合
	1月20日 (水)	第3回検討委員会 ・調査対象地の検討	●調査対象地の検討 ●立地回避条件の設定<2>	①～⑤の条件に基づき検討 ⑥地形（傾斜15度超）要件 ⑦構造物要件 ⑧不整形地の除外
	2月26日 (金)	第4回検討委員会 ・第1次調査対象地の決定 ・第2次調査対象地の検討	●第1次調査対象地の決定 ●調査対象エリアの設定 ●立地回避条件の追加設定<1>	466箇所 41地域⇒32エリア ⑨調査対象エリア除外要件 ⑩アクセスの容易性
平成 28 年度	5月24日 (火)	第5回検討委員会 ・第2次調査対象地の決定 ・簡易評価方法の検討 ・第3次調査対象地の検討	●第2次調査対象地の決定 ●立地回避条件の追加設定<2>	221箇所（466⇒221） ⑪都市計画要件 ⑫圃場整備要件 ⑬浸水想定区域
	6月29日 (水)	第6回検討委員会 ・簡易評価方法の検討 ・第3次調査対象地の検討	●回避条件設定後の調査対象地 ●エリア評価と調査対象地評価 による第3次調査対象地の評 価方法の検討	（暫定134箇所（221⇒134））
	7月29日 (金)	第7回検討委員会 ・第3次調査対象地の決定 ・簡易評価方法の決定 ・第1次整備候補地の検討	●第3次調査対象地の決定 ●客観的評価による整備候補地 の検討	60箇所（221⇒（134）⇒60） ⑭物理的制約条件の適合 ⑮収集・運搬の効率性 ⑯用地取得の可能性 ⑰余熱等利用の関係 ⑱関連施設との関係
	8月～9月	整備候補地の情報提供依頼	広報（8月15日号）、ホームペ ージ等による周知	情報提供：1件
	10月14日 (金)	第8回検討委員会 ・第1次整備候補地の決定 ・第2次整備候補地の検討	●第1次整備候補地の決定 ●検討委員による客観的評価	17箇所（60⇒（61）⇒17） ①～⑱の条件に基づき検討
	11月17日 (木)	第9回検討委員会 ・第2次整備候補地の決定	●第2次整備候補地の決定 ●委員による相対（比較）評価	9箇所（17⇒（12）⇒9） ⑲比較評価
	11月28日 (月)	第10回検討委員会 ・候補地の現地調査	●第2次整備候補地を対象に現 地及び周辺の視察、確認	・前回までの検討内容を現地にて 確認
	1月26日 (木) 【追加】	第11回検討委員会 ・最終整備候補地選定方法 の決定	現地調査結果を総合評価に反映 する方法と、最終整備候補地の選 定方法を決定する。	
	2月	第12回検討委員会 ・最終整備候補地の選定	最終整備候補地3箇所程度を選 定する。	⑳評価項目の重み付け
	3月	第13回検討委員会 ・報告書（最終整備候補地 決定）のとりまとめ	施設の整備の方向性等について、 詳細を詰めるべき事項を確認、整 理する。	・選定経過及び結果内容 ・周辺住民の理解 ・環境・景観の配慮事項 ・施設の付帯機能（還元施設等）

整備候補地選定フロー

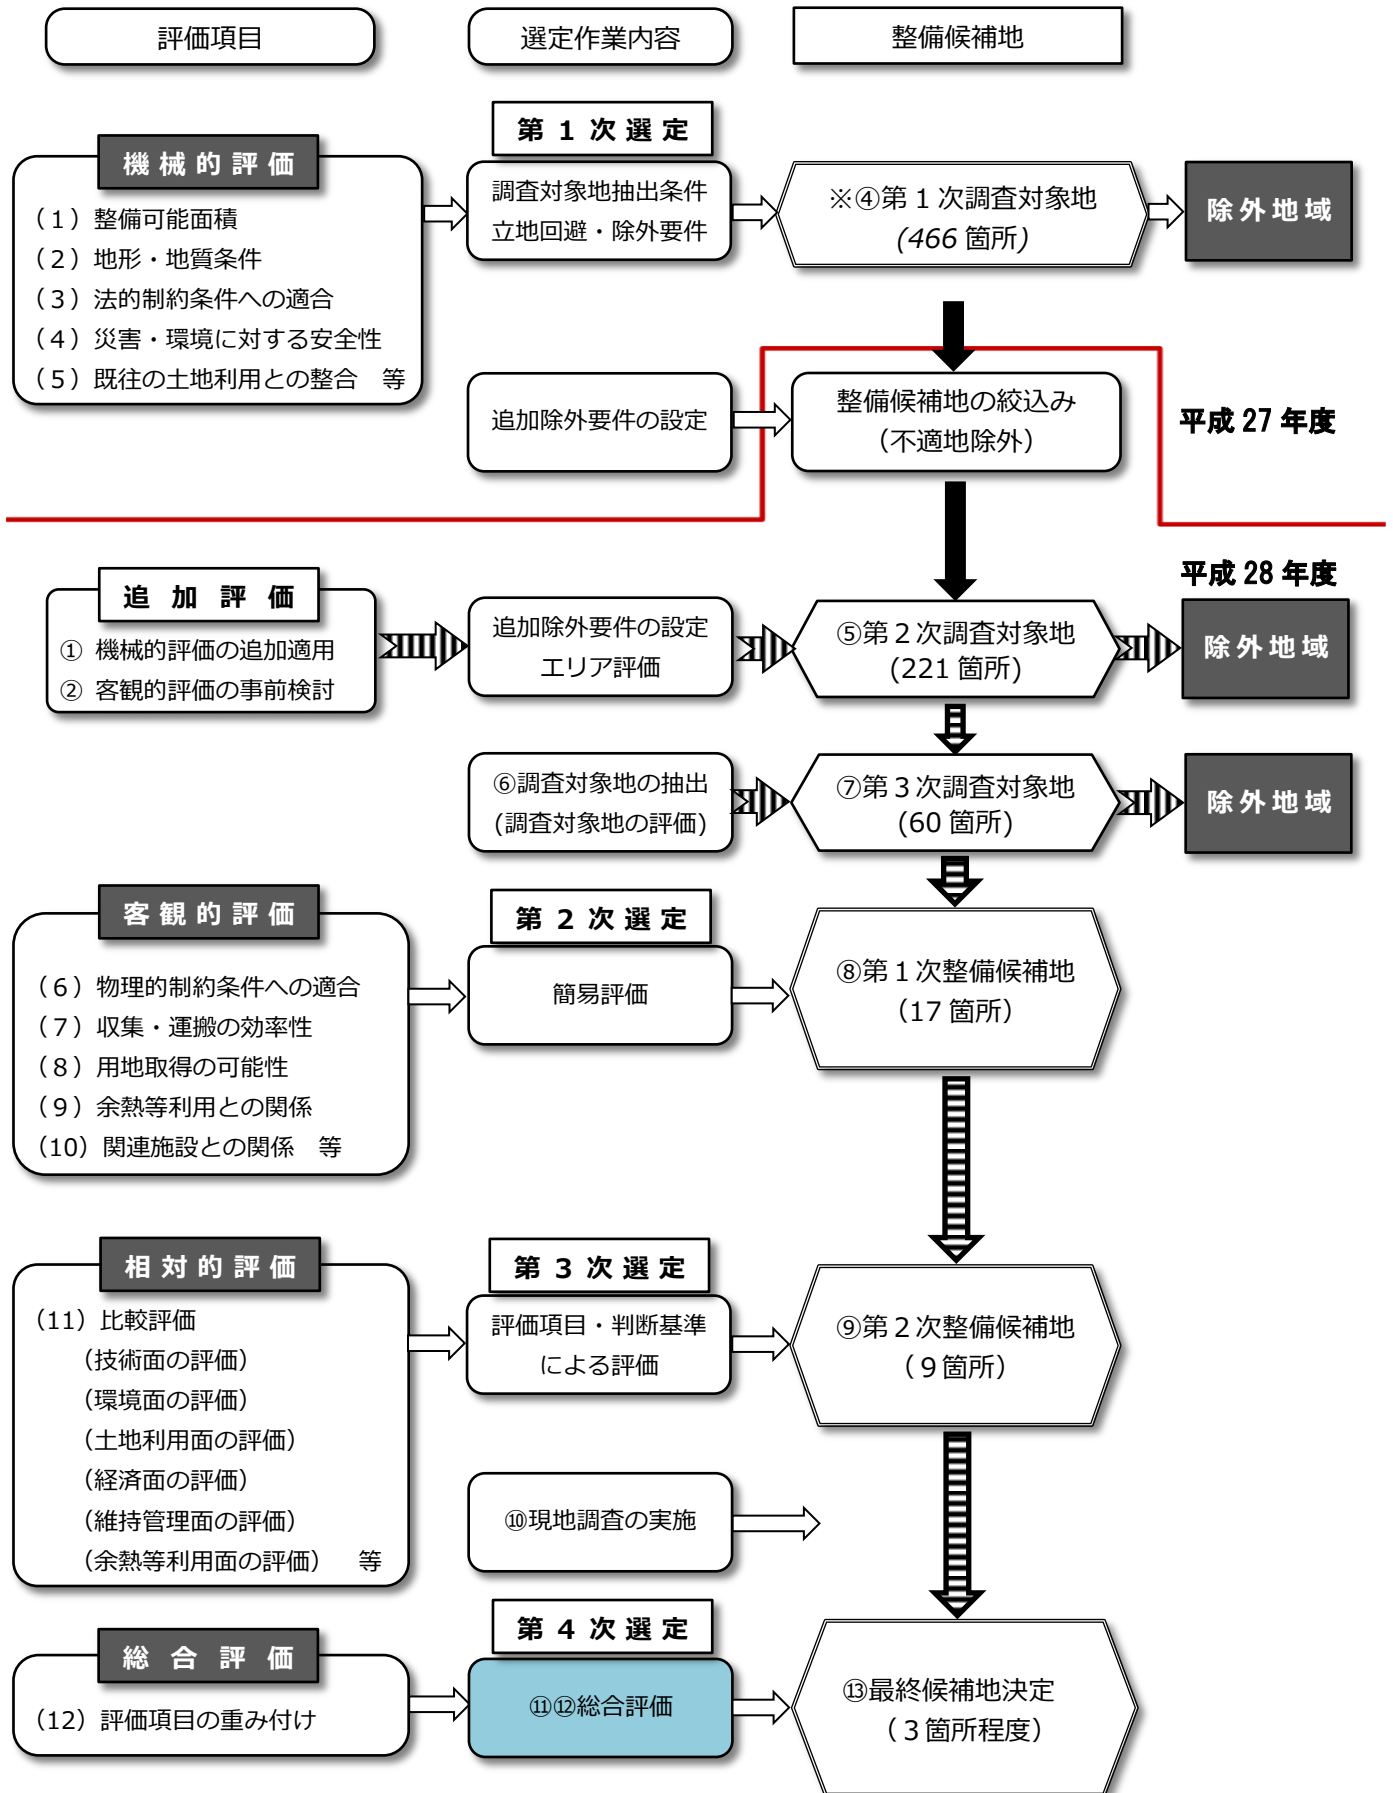

※「○」の中の数字は、検討委員会の回数を示す。
